

中国移动（广东广州）数据中心一期工程

水土保持设施验收报告

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司

编制单位：广州市中扬环保工程有限公司

2022年6月



编制单位营业执照(副本)

单位地址： 广州市番禺区市桥街云星珠坑村珠坑大道
2号316室

单位联系人： 刘明辉

联系电话： 13503064186

电子邮箱： 15233364@qq.com

中国移动（广东广州）数据中心一期工程
水土保持设施验收报告

责任页

广州市中扬环保工程有限公司

批	准：	刘明辉 _____	总经理	
核	定：	卢 军 _____	工程师	
审	查：	冯伙荣 _____	工程师	
校	核：	欧艳芬 _____	工程师	
项目	负责人：	刘明辉 _____	工程师	
编	写：	庞兆东 _____	助理工程师	前言、第 3 章
		何梓浩 _____	助理工程师	第 1、2、4 章
		周君仪 _____	助理工程师	第 5、6、7 章
		韦高俊 _____	助理工程师	附图、附件

目 录

前言.....	1
1 项目及项目区概况.....	6
1.1 项目概况.....	6
1.2 项目区概况.....	9
2 水土保持方案和设计情况.....	11
2.1 主体工程设计.....	11
2.2 水土保持方案.....	11
2.3 水土保持方案变更.....	13
2.4 水土保持后续设计.....	13
3 水土保持方案实施情况.....	15
3.1 水土流失防治责任范围.....	15
3.3 水土保持措施总体布局.....	16
3.4 水土保持设施完成情况.....	16
3.5 水土保持投资完成情况.....	19
4 水土保持工程质量.....	21
4.1 质量管理体系.....	21
4.2 各防治分区水土保持工程质量评价.....	23
4.3 总体质量评价.....	24
5 项目初期运行及水土保持效果.....	26
5.1 运行情况.....	26
5.2 水土保持效果.....	26
5.3 公众满意度调查.....	28
6 水土保持管理.....	29
6.1 组织领导.....	29
6.2 规章制度.....	29
6.3 建设过程.....	31
6.4 水土保持监测.....	31
6.5 水土保持监理.....	32
6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况.....	33
6.7 水土保持补偿费缴纳情况.....	33
6.8 水土保持设施管理维护.....	33
7 结论及下阶段工作安排.....	35
7.1 结论.....	35

7.2 遗留问题安排.....	36
8 附件及附图.....	37
8.1 附件.....	37
8.2 附图.....	38

前言

根据中国移动广东有限公司已通过评审的《十二五发展规划》、《2012~2014年三年滚动规划》及2012年9月评审通过的《2013~2015年三年滚动规划》，广东移动IDC机房考虑近五年的需求，广州大区总需求缺口为5701架，其中IDC缺口2286架，自有业务需求缺口3415架。

同时中国移动（广东广州）数据中心的建设是为了落实广州市政府建设“智慧广州”的整体部署，配套完善区域基础设施，推进广州信息产业的发展。项目的落成将成为建设“智慧广州”的重要节点。符合筹建单位的实际情况，项目的建设是十分必要的。

中国移动（广东广州）数据中心一期工程位于中新广州知识城九龙工业园区凤凰五路延长线以南，KN1-2路（沿凤凰三横路）以东侧地块。

本项目总用地面积2.50hm²，均为永久占地（临时用地位于二期建设项目用地，主要为施工生产办公区，本项目完工后相关水土保持防治责任移交建设单位的二期工程项目。因此临时用地不纳入验收范围）。

一期工程规划总建筑面积约：55779.59 m²，包括一栋地上22071.59 m²、地下666 m²的云计算中心、一栋地上22050.80 m²，地下666 m²的通信支撑中心、一栋地上6705.2 m²，地下314.9 m²的支撑创新中心。建筑密度为44.1%，容积率为2.5，绿地率为20.6%。不涉及建筑拆迁项目。建设内容包括建筑工程、道路广场工程、景观绿化工程、排水管线工程等配套设施。

2015年12月9日，广州开发区发展改革和金融工作局下发《广东省企业投资项目备案证》（见附件2）；

2015年12月1日，取得中新广州知识城规划和国土资源管理局发放的《建设用地规划许可证》（见附件4）；

2016年2月，建设单位取得广州开发区建设和环境保护局《关于中国移动（广东广州）数据中心一期工程初步设计审查回复意见》。（见附件5）。

工程2016年8月开工，2018年6月底完工，概算总投资7.0亿元。建设单位为中国移动通信集团广东有限公司广州分公司（以下简称“建设单位”）。

根据国家水土保持法律法规的有关规定，2016年7月，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称“方案编制单位”）编制完成《中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案报告书》，2016年8月23日，广州市黄埔区水务局以《关于中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案的复函》（埔水函[2016]268号）批复了本项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围为6.10hm²。实际发生水土流失防治责任范围2.50hm²。原规划二期、三期的用地3.50hm²，已另行立项筹备建设，对相关水土保持防治责任进行剥离，故不在本项目验收范围（立项文件详见附件3）。

工程建设过程中建设单位将水土保持工程纳入到主体工程的建设内容一并进行招标。主体工程设计单位在主体施工图中一并进行水土保持工程措施和植物措施设计。工程施工过程中，施工单位对水土保持措施进行施工，监理单位对工程建设全过程进行了监理，监测单位在施工期间进行水土保持监测工作。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，受建设单位的委托，广州市中扬环保工程有限公司（以下简称我公司）承担了工程水土保持设施验收报告编制工作，为工程竣工验收提供技术依据。接受任务后，我公司组织专业技术人员组成水土保

持设施验收组，组织开展本工程水土保持设施的验收工作。根据批复的水土保持方案和相关设计文件，验收组通过收集、查阅工程档案资料，核实措施工程量和验收质量记录，调查水土保持设施现状，走访水行政主管部门、当地群众了解工程建设期间水土流失情况，通过对一期工程水土流失现状、水土保持设施功能及效果评估，验收组对调查过程中发现的不满足水土保持验收要求的事项向建设单位提交书面完善意见。于 2022 年 6 月，编写完成《中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持设施验收报告》。

经现场评估，中国移动（广东广州）数据中心一期工程实际发生水土流失防治责任范围为项目建设区 2.50hm²。到目前为止，对施工所造成的扰动土地进行了较全面的整治，使人为新增的水土流失得到有效控制，原有的水土流失得到基本治理。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《广东省水土保持条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》等相关规定及本项目水土保持方案批复文件相关要求，建设单位进行自查初验，水土保持措施布局合理，防治措施体系完善，各项设施质量合格。本项目扰动土地整治率达到 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 98%以上，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 27.6%，达到批复水土保持方案设定的水土流失防治标准，水土保持设施总体达到了竣工验收的条件和标准。

水土保持设施验收特性表

工程名称	中国移动（广东广州）数据中心一期工程		工程地点	广州市黄埔区	
工程类别	房地产工程		项目性质	新建工程	
工程规模	总占地 2.50 公顷		主管部门 (或主要投资人)	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	
所在流域	珠江流域		国家或省级重点 防治区类型	不涉及	
水土保持方案批复 部门、文号及时间	广州市黄埔区水务局，2016 年 8 月 23 日，埔水函[2016]268 号				
初步设计审批部 门、文号及时间	广州开发区建设和环境保护局，穗开建环知函（2016）15 号，2016 年 2 月				
建设工期	2016 年 8 月~2018 年 6 月				
防治责任范围 (hm ²)	批复的水土流失防治责任范围		6.10		
	验收的水土流失防治责任范围		2.50		
	运行期水土流失防治责任范围		2.50		
水保方 案确定 水土流 失防治 目标	扰动土地整治率 (%)	95	实际完成水 土流失防治 目标	扰动土地整治率 (%)	100
	水土流失总治理度 (%)	97		水土流失总治理度 (%)	100
	土壤流失控制比	1.0		土壤流失控制比	1.0
	拦渣率 (%)	95		拦渣率 (%)	98
	林草植被恢复率 (%)	99		林草植被恢复率 (%)	100
	林草覆盖率 (%)	27		林草覆盖率 (%)	27.6
水土保持措施 主要工程量	工程措施	雨水管网 1120m			
	植物措施	绿化措施 0.38hm ² ，铺植草皮 0.15 hm ² ，植草砖绿化 0.16 hm ² 。			
	临时措施	临时排水沟 460m、临时沉沙池 6 座、基坑截排水沟 760m、集水井 6 座。			
工程质量评定	评定项目	总体质量评定		外观质量评定	
	工程措施	合格		合格	
	植物措施	合格		合格	
水土保持投资	水保方案投资 (万元)	168.25 万元			
	实际投资 (万元)	159.40 万元			
工程总体评价	水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规的要求，防治效果达到方案防治目标，工程质量满足验收标准				
水土保持方案编制 单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司		施工单位	广州市房屋开发建设有限公司	
水土保持监测单位	珠江水资源保护科学研究所		水土保持监 理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	
水土保持验收报告 编制单位	广州市中扬环保工程有限公司		建设单位	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	
地址	广州市番禺区市桥街云星珠		地址	广州市琶洲大道 51 号广州琶	

	坑村珠坑大道 2 号 316 室		洲信息大厦
联系人	刘明辉	联系人	李正杰
电话	13503064186	电话	13922200942
传真/邮编	511402	传真/邮编	15800158000
电子信箱	3273806650@qq.com	电子信箱	13922200942@139.com

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

本项目位于中新广州知识城九龙工业园区凤凰五路延长线以南，KN1-2路（沿凤凰三横路）以东侧地块。其中心地理坐标：位于北纬 $23^{\circ}23'13.31''$ ，东经 $113^{\circ}29'50.65''$ 。项目的地理位置详见图 1-1。



图 1-1 项目地理位置图

1.1.2 项目组成及布置

根据项目建设内容，将项目组成划分为建筑工程、道路广场工程、景观绿化工程、排水管线工程等配套设施。

建筑工程

一期工程规划总建筑面积约 54507m²，包括一栋约云计算中心、一栋通信支撑中心、一栋支撑创新中心及配套设施。

道路广场工程

通设计人车分流，以外围车行道结合内部人行空间形成隔离外部干扰的内向型景观空间。外围结合消防车道及建筑形体布置，并向内延伸，形成多层次联结的景观空间体系。营造方便、舒适、美观的步行交通系统。车行系统采用整个园区总体环通+一条 L 形主要道路连通，辅以枝状道路联系的方式组织，满足消防扑救要求。云计算中心、通信支撑中心等重点建筑独立环通以确保使用方便与安全。园区主要入口设在用地东侧的规划路，临近规划路主入口出设置支撑创新中心。将一期云计算中心、通信支撑中心放在临近西南侧的次入口。次入口设在用地西南侧规划凤凰三横路上，根据分期建设情况和实际使用要求分期开放使用，以期保证数据中心的使用安全。云计算中心、通信支撑中心两个单体周边也形成环道，方便人流和货流的出入，同时满足消防要求。

景观绿化工程

绿化设计主要布置矮灌木、草坪、花坛、小品雕塑等。铺地绿化根据建筑的时尚、科技的主题风格，运用规则的几何图案进行设计，图案绿地种植棕榈科观赏植物，树下设休息座椅及指示牌等。

排水管线工程

屋面雨水采用管道内排水系统排至室外雨水管网；室外雨水由雨水口收集后排至室外雨水管网。

建筑屋面雨水排水应设置溢流口，溢流系统的总排水沟能力不宜小于设计重现期为 50 年、降雨历时 5min 时的设计雨水流量。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。

小区排水方式采用雨水，污水分流制。

本项目仅负责建筑物及门前道路的雨水排水，建筑物集雨经雨水管经收集排至地面，经雨水口收集排入道路两侧地下雨水管，最终汇入周边市政管道。

1.1.3 施工组织及工期

(1) 相关参建单位

工程建设单位：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司

主体工程设计单位：广东省电信规划设计院有限公司

水土保持方案编制单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

主体工程施工单位：广州市房屋开发建设有限公司

工程监理单位：广州市广州工程建设监理有限公司

水保监测单位：珠江水资源保护科学研究所

(2) 施工道路

项目区交通方便。西南侧紧靠知识城凤凰三横路，东接南支路，用于场内外材料运输，交通运输条件较好。基本能满足施工期间的通行需求，无需再修建施工便道。

(3) 施工生产办公区

施工生产办公区布设在场地西侧，作为临时项目部板房使用，该区域面积为 0.66hm^2 。临时用地位于二期建设项目用地，本项目完工后移交建设单位的二期工程项目进行建设。因此临时用地不纳入本项目验收范围。

施工生产办公区已进行硬化，排水系统完善，无水土流失风险。

(4) 施工工期

工程于 2016 年 8 月开工，2018 年 6 月底完工。

1.1.4 土石方情况

本工程总挖方量 3.17 万 m³，总填方量 1.47 万 m³，其中回填土方 1.45 万 m³，种植土 0.02 万 m³；借方 0.02 万 m³，全部为种植土；余方 1.72 万 m³ 堆放在二期进行回填综合利用，弃方 0 万 m³。

本项目借方为外购土方，共 0.02 万 m³，主要是绿化覆土，项目借方全部从当地具合法供应手续的公司采购，水土流失防治责任由供应商负责。

1.1.5 征占地情况

本工程总占地 2.50hm²，均为永久占地。

1.1.6 项目投资

工程批复概算总投资 7.0 亿元。项目法人为中国移动通信集团广东有限公司广州分公司。

1.1.7 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建问题。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

项目位于广州市黄埔区，南沙区地貌主要为河口冲积平原。气候类型属南亚热带海洋季风性气候。多年平均气温为 21.6℃，多年平均降水量约 1795mm。本区为台风影响区，台风一般发生在 7~9 月。项目区主要土壤类型为赤红壤，地带性植被为南亚热带常绿阔叶林，现状植被多为农作物、苗圃苗木、道路绿化带以及杂草等。

项目区以水力侵蚀为主，属南方红壤丘陵区，土壤侵蚀容许值为 500t/km².a。

1.2.2 水土流失及防治情况

按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），广东省土壤

侵蚀类型为 I₄ 南方红壤丘陵区中的岭南平原丘陵区。根据《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》和水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知》（办水保〔2013〕188号），广州市黄埔区不属于国家级和广东省水土流失重点预防区和治理区。

项目区的土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀形态主要为面蚀，其次为沟蚀。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2014年2月，广东省电信规划设计院有限公司完成《中国移动（广东广州）数据中心一期工程可行性研究报告》；

2016年2月，广州开发区建设和环境保护局以《关于中国移动（广东广州）数据中心一期工程初步设计审查回复意见》（穗开建环知函〔2016〕15号）同意本项目初步设计。

2.2 水土保持方案

2.2.1 水土保持方案批复

2016年8月23日，广州市黄埔区水务局以《关于中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案的复函》（埔水函〔2016〕268号）批复了本项目水土保持方案。

2.2.2 批复的水土保持方案主要内容

1、一期工程量与投资剥离原则

建设单位对本方案二三期工程范围另行立项实施，根据《中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案报告书》（报批稿），水土保持方案中已对工程扰动面积、土石方工程量、新增水土保持措施、新增水土保持措施投资进行剥离统计，验收报告中通过对设计文件进行分析，剥离一期工程区内完成的水土保持工程量。

2、水土流失防治责任范围及防治分区

水土保持方案确定的防治责任范围面积共计6.10hm²，其中一期工程区防治责任范围2.50hm²。

3、水土流失防治目标

根据《中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案报告书》（报批稿）及该项目水土保持方案批复文件，确定的水土流失防治一

级目标值。


设计水平年防治目标确定为：扰动土地整治率 95%，水土流失总治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 95%，林草植被恢复率 99%，林草覆盖率 27%。

4、土石方平衡情况

本项目挖方量约 2.18 万 m³，填方量约 2.23 万 m³；借方量约为 0.05 万 m³，均外购；弃方量为 0.0 万 m³。

5、水土保持措施

水土保持方案根据划定的 3 个防治分区进行防治措施的布置。水土流失防治措施体系详见图 2-1。

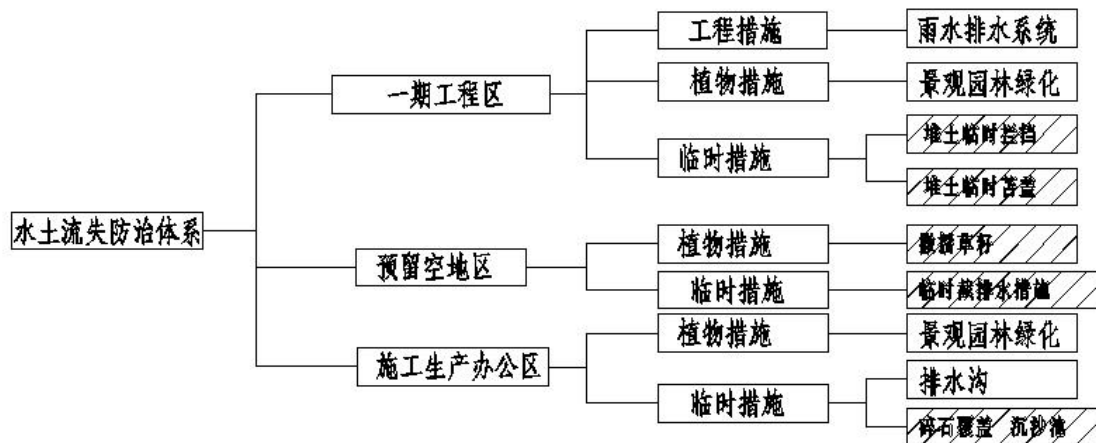

注：斜线框格为方案新增措施

图 2-1 水土保持方案水土保持措施体系框图

6、水土保持投资估算

(1) 水保方案确定水土保持投资情况

批复的水土保持方案报告书中，总投资 191.80 万元，其中主体已列投资 149.41 万元、方案新增投资 41.77 万元。

水土保持工程措施费 53.39 万元，植物措施费 66.21 万元，临时工程费 36.54 万元，独立费用 32.67 万元（建设单位管理费 0.13 万元、工程建设监理费 0.20 万元、科研勘测设计费 1.38 万元、水土保持监测费 30.93 万元），基本预备费 2.36 万元。根据水土保持方案批复，本项目水土保

持补偿费待广州市相关办法出台后进行补缴。

(2) 一期工程水土保持工程投资情况

根据一期工程投资剥离原则，确定一期工程水土保持投资。一期工程水土保持工程总投资为 168.25 万元，其中工程措施投资 53.39 万元、植物措施投资 51.80 万元、临时工程投资 28.04 万元、水土保持监测费 30.93 万元、独立费用 32.66 万元、基本预备费 2.36 万元，根据水土保持方案批复，本项目水土保持补偿费待广州市相关办法出台后进行补缴。

2.3 水土保持方案变更

依据水利部办公厅下发的《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65 号文），对照批复的水土保持方案报告书，设计单位、水土保持设施验收编制单位对本项目水土保持变动情况进行梳理，本工程在建设过程中未发生重大变更。详见表 2-2。

2.4 水土保持后续设计

本工程水土保持方案经广州市黄埔区水务局批复后，水土保持方案设计的土地整治工程、植被建设工程和临时防护工程等措施一并纳入到初步设计和施工图设计内容中。

表 2-2 中国移动（广东广州）数据中心一期工程项目建设方案变化情况水保梳理表

重大变动项目		水保方案	工程实际	变动情况对照	
地点 规模	1	涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者治理区	不属于国家级/省级重点预防区、治理区	不属于国家级/省级重点预防区、治理区	无变更
	2	水土流失防治责任范围增加 30%以上	一期工程区 2.50hm ²	一期工程区 2.50hm ²	无变更
	3	开挖填筑土石方总量增加 30%以上	总挖方 2.18 万 m ³ ，总填方 2.23 万 m ³ 。挖填总量 4.41 万 m ³	总挖方量为 3.17 万 m ³ ，填方总量 1.47 万 m ³ ，挖填总量 4.64 万 m ³	挖填总量增加 0.23 万 m ³ ，增加 5.21%，不构成重大变更
	4	线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300m 的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上	/	/	本工程为点型项目
	5	施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上	未设置施工道路	未设置施工道路	不构成重大变更
	6	桥梁改路堤累计长度 20km 以上	不涉及	不涉及	不构成重大变更
	7	隧道改路堑累计长度 20km 以上	不涉及	不涉及	不构成重大变更
水土保持措施	8	表土剥离量减少 30%以上	0.0 万 m ³	0.0 万 m ³	不构成重大变更
	9	植物措施总面积减少 30%以上	景观绿化面积 0.52hm ² 。	景观绿化面积 0.69hm ² 。	不构成重大变更
	10	水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失	用以植物措施与工程措施相结合的防治方法	用以植物措施与工程措施相结合的防治方法	不构成重大变更
弃渣场	11	水保方案确定的专门存放地外新设弃渣场（大于 1hm ² 或最大堆渣高度高于 10m），或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上	无弃渣场	无弃渣场	不构成重大变更

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 水土保持方案批复的防治责任范围

根据 2016 年 8 月 23 日，广州市黄埔区水务局以《关于中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案的复函》（埔水函[2016]268 号）批复了本项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围为 6.10hm²。

3.1.2 实际水土流失防治责任范围

根据工程征占地、施工资料和现场勘查情况，工程实际水土流失防治责任范围面积为 2.50hm²。

3.1.3 水土流失防治责任范围变化原因

工程实际水土流失责任范围面积为 2.50hm²，较水土保持方案批复的水土流失防治责任范围 6.10hm² 对比，实际防治责任范围面积减少了，水土流失防治责任范围增减变化情况详见表 3-1。

表 3-1 水土流失防治责任范围增减变化表 单位：hm²

防治分区	批复方案面积	实际面积	面积增减 (实际-批复)	备注
一期工程区	2.50	2.50	+0.00	
施工生产办公区	0.66	(0.66)	-0.66	临时用地位于二期建设项目用地，本项目完工后相关水土保持防治责任移交建设单位的二期工程项目。因此临时用地不纳入验收范围
预留办公区	2.88	0.0	-2.88	属于二期建设项目用地
直接影响区	0.11	0.0	-0.11	
合计	6.10	2.50	-3.50	

本项目的防治分区设置和方案设计情况相比有所变化，实际建设中预留办公区、施工生产办公区纳入二期建设项目范围，不纳入本项目验

收范围，本工程实际防治责任面积减少。

在施工过程中，建设单位加强对施工单位的管理，严格要求施工单位控制施工范围，禁止对征地红线外区域进行扰动、破坏，施工单位认真执行该项规定，在施工过程中，未对征地红线外区域造成影响。不计列直接影响区。

3.2 取土场设置

根据批复的水土保持方案报告书，借土方量 0.05 万 m³，为外购土方，未设置取土场。

实际施工过程中，外借土方量为 0.02 万 m³，均为外购土，未设置取土场。

3.3 弃土场设置

根据批复的水土保持方案报告书，设产生弃渣 0.0 万 m³，不设弃土场。

实际施工过程中，外弃土量为 0.0 万 m³，本项目未设置弃土场。

3.3 水土保持措施总体布局

水土保持方案编制的目的就是从小水土保持角度出发，建立统一、科学、完善的防治措施体系，达到控制水土流失、恢复和改善生态环境的目标；结合工程用地性质，对项目区可实施绿化的区域进行绿化，提高项目区的植被覆盖率，改善项目区生态环境条件；开挖损坏原地貌植被的地点，经工程措施及植物措施治理后，减少土壤流失量，基本恢复和控制水土流失。防治措施体系总体上按“分片集中治理、分单元控制”的方式进行布局。以一期工程区 1 个防治分区为单元进行综合治理。

3.4 水土保持设施完成情况

3.4.1 实际完成水土保持设施工程量

根据工程水土流失的特点，项目建设区水土流失防治措施主要为排

水管沟、绿化地及施工期临时措施，本项目水土保持措施实际完成情况与方案设计对比一览详见表 3-2。

一期工程区

工程措施：雨水工程 1120m；

植物措施：绿化措施 0.38hm²，铺植草皮 0.15 hm²，植草砖绿化 0.16 hm²；

临时措施：临时排水沟 460m、临时沉沙池 6 座、基坑截排水沟 760m、集水井 6 座。

3.4.2 水土保持设施工程量增减变化分析

(1) 工程措施增减变化

实际完成的水土保持工程措施与批复水保方案一致。

(2) 植物措施增减变化

优化设计方案，对绿化进行了调整，增加了绿化面积。

(3) 临时措施增减变化

施工过程中施工条件发生变化，设计进行了优化，增加了临时排水。因土方调配方案优化，取消临时堆土的方案，因此不再实施临时堆土的临时拦挡及遮盖措施。

表 3-2 水土保持工程措施增减变化对比表

序号	工程或费用名称	单位	方案设计	实际施工	增减变化
一	工程措施				
1.1	雨水排水管网	m	1120	1120	0
二	植物措施				0
1.1	景观绿化	m ²	5000	3800	-1200
1.2	铺设草皮	m ²	1547	1547	0
1.3	植草砖绿化	m ²	0	1600	+1600
三	临时措施				0
1.1	临时排水沟	m	460	460	0
1.2	临时沉沙池	座	2	6	+4
1.3	基坑截排水沟	m	760	760	0
1.4	集水井	个	6	6	0
1.5	编织袋拦挡	m	160	0	-160
1.6	临时覆盖	m ²	2000	0	-2000

3.5 水土保持投资完成情况

(1) 实际完成水土保持投资

通过查阅有关资料和调查,本项目共完成水土保持投资 159.40 万元。

(2) 水土保持投资变化

批复的水土保持方案报告书中,水土保持投资 168.25 万元。实际较方案水土保持投资减少 8.86 万元。水土保持投资变化详见表 3-3。

表 3-3 水土保持投资施增减变化对比表

序号	工程或费用名称	方案投资	实际投资	较方案增(+)-减(-)变化
一	工程措施	53.39	53.39	0.00
1.1	雨水排水管网	53.39	53.39	0.00
二	植物措施	57.80	43.96	-13.84
1.1	景观绿化	56.00	38.00	-18.00
1.2	铺设草皮	1.80	1.80	0.00
1.3	植草砖绿化		4.16	4.16
三	临时措施	29.07	25.14	-3.93
1.1	临时排水沟	1.03	0.34	-0.69
1.2	临时沉沙池	0.3	0.00	-0.30
1.3	基坑截排水沟	24.32	24.32	0.00
1.4	集水井	0.48	0.48	0.00
1.5	编织袋拦挡	1.77	0.00	-1.77
1.6	临时覆盖	1.17	0.00	-1.17
4	第四部分 独立费用	32.66	34.06	1.40
4.1	建设管理费	0.13	0.13	0.00
4.2	水土保持监测费	30.93	30.93	0.00
4.3	水土保持监理费	0.2	0	-0.20
4.4	科研勘察设计费	1.38	0	-1.38
4.5	第三方强制性检测费	0.02	0	-0.02
4.6	水土保持设施验收评估费	0	3	3.00
5	预备费	2.36	2.36	0.00
6	水土保持设施补偿费	0	0	0.00
7	水保总投资	168.25	159.40	-8.86

水土保持投资发生变化主要原因为:

第一个方面是植物、临时措施实施的工程量与水土保持方案设计工

程量有所增加，同时优化植物选种，投资额减少。

第二个方面工程建设管理费、勘测设计费、监理费、第三方强制性检测费均由建设单位纳入项目统一管理承担；水土保持设施验收费根据实际发生费用计列，对比方案投资有所增加。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

建设单位将各项水土保持措施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。在工程准备初期，为确保各项水土保持措施落实到实处，加强了工程招投标、合同管理和工程建设监理等方面工作。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，积极推行“四位一体”的运作机制，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

4.1.1 建设单位质量管理体系

建设单位为加强水保工作管理，实现工程总体目标，监理、施工单位成立了水土保持工作协调小组，并指派专人予以负责。制定了一系列管理制度，明确质量责任，防范建设中不规范行为。

一、建立健全了管理体系。各项目部配备了专职人员负责具体工作，并组织学习相关的法律法规文件。

二、实行水保监理制。要求监理人审查施工组织设计是否按“水土保持方案报告书”有关要求制定施工中的水保措施，监督施工单位落实水保措施，做好水土保持资料的记录工作。

三、落实水保工作责任制。明确项目第一负责人同时也是水保工作负责人，做到凡事有人负责，有人监督，有人检查，有据可查。

四、在主体工程招标技术文件中，按水土保持工程技术要求，将水土保持工程措施纳入招标文件的正式条款中。中标后，施工单位与业主

签订的施工合同中明确承包商的水土流失防治责任，制定了实施、检查、验收的具体方法和要求。

五、基本落实了水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用的“三同时”制度。

六、将水土保持工作常态化，设置水保工作汇报协调。

4.1.2 施工单位质量管理体系

为加强工程质量管理，实现工程总体目标，本项目施工单位高度重视水土保持工作开展。项目部以工程管理部为综合治理工作责任部门，具体落实各项措施落实情况，工程部制定相应实施方案及做好相应交底，并做好施工过程管理工作。制定了完善水土保持及环保工作制度，并严格执行，宣传到位、落实到位；制定了一系列质量管理体系，明确质量责任，防范建设中不规范行为。一是建立健全质量监督管理体系。各项目部设置了专门的质量管理部门，并配备了专职质量管理人员和监督验收人员。二是实行全面质量管理。施工单位的三级质检员、特殊工种的作业人员、试验室、计量器具和分包单位，必须通过资质审查后才能上岗。对于资质不全或不在有效期内的人员和单位，坚决要求退场，并根据有关规定给予施工单位经济处罚。建立质量奖惩制度，充分发挥参建人员的积极性。三是落实质量责任制。明确项目第一负责人同时也是质量负责人，做到凡事有人负责，有人监督，有人检查，有据可查。四是结合工程实际情况，质量目标、质量保证体系及技术措施，并确定土建分部工程优良率 95%以上。五是督促承包人严格落实“三检”（自检、复检、终检），建立了“承包单位班组自检、承包单位复检、监理工程师终检”的三级质量管理模式，层层落实质量管理责任制，形成了上下贯通、内外一体的质量保证体系。

4.1.3 监理单位质量管理体系

根据国家对建设工程有关规定，建设单位委托广州市广州工程建设

监理有限公司负责本项目工程建设全过程监理，包含水土保持监理内容。监理单位组建了项目监理部，监理部驻地设项目区内。监理人员由总监理工程师、专业监理工程师组成，作为现场监理工作执行和指挥机构，实行总监负责制，依据建设单位授权，对建设项目进行全面监理。

该项目水土保持监理对施工过程中的关键部位及工序进行旁站监理，尤其加强对隐蔽工程和关键工序的中间验收。在工程质量控制方面，水土保持监理项目部严格按精品工程要求审查施工单位的组织管理体系、质量保证体系、安全保障体系及施工组织设计、施工方案及施工措施，并且在实际施工中严格监督施工单位贯彻落实。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

水土保持工程质量评估采用查阅施工记录、监理记录、监测报告和自检报告等资料，结合现场检查情况进行综合评定。现场检查采取全面检查和抽查相结合的办法。质量评估分工程措施和植物措施两大部分进行，并根据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》GB/T22490-2018）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的要求，开展质量评定工作。

4.2.1 工程项目划分及结果

根据主体工程设计和施工部署，按照工程类型和便于质量管理等原则，结合水土保持方案中水土流失防治分区划分情况，本项目水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程和分项工程。

根据现场调查情况、监理工作总结报告以及质监单位的质量评定报告，本工程水土保持共涉及 2 个单位工程，3 个分部工程，18 个分项工程。对于本工程的质量评定，水土保持工程的项目划分和评定结果直接引用监理单位的质量评定结论。

4.2.2 各防治分区工程质量评价

单位工程质量由承建单位组织评定，监理单位复核。在各分部工程完工、质量合格或有关质量缺陷已经处理完毕时，建设单位委托监理单位主持，组织各参建单位开展各分部工程的自查初验工作。在各参建单位的共同努力下，现工程各项水土保持措施基本完成，分部工程、单位工程质量评定结果总体合格。

工程自检评定的 2 个单位工程、3 个分部工程质量全部合格，抽检合格率达到 100%。

竣工资料反映的工程划分及质量评定情况详见表 4-1。

表 4-1 水土保持工程项目划分及评定表

项目分区	单位工程	数量	分部工程	数量	分项工程数量	评定等级
一期工程区	室外排水管网	1	排水管道安装	1	5	合格
			排水管沟与井池	1	5	合格
	室外环境	1	场坪绿化	1	8	合格
合计		2		3	18	

4.3 总体质量评价

该项目建设过程中重视水土保持工作，将水土保持工程措施纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系，确保了各个环节水土保持工程质量能够有效把控。

该项目水土保持设施建设过程中整理归档的资料基本做到齐全、系统、完整，能反映工程建设活动和工程实际状况。该项目实施的水土保持工程表面平整，结构完整，勾缝均匀，水泥砂浆充填密实牢固，外形美观，无明显的工程缺陷，植物措施品种选择合理，生长情况良好，覆盖率高。2018 年 6 月，建设单位、施工单位和监理单位对本项目防洪排

导工程和植被建设工程进行了验收，工程质量控制、验评和施工资料情况如下：施工符合设计图纸要求，工程质量按相关施工规范进行施工，施工资料整理齐全，符合验收标准。

综上所述，该项目的水土保持工程管理措施得力，资料基本齐全，外观质量满足设计要求，水土保持工程措施质量合格，基本能够起到防治水土流失的作用，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用。

5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

工程至通车运行至今，水保措施运行良好，防治效果明显，达到水土保持方案确定的防治目标。施工过程中的水土流失基本得到有效控制。项目区完成的水土保持设施较好地发挥保持水土、改善环境的作用。

5.2 水土保持效果

水土保持效果根据六项防治指标目标值确定。六项水土流失防治目标值计算根据主体竣工资料和项目现场核查结果计算。

(1) 扰动土地整治率

工程实际扰动土地面积为 2.50hm²，总计扰动土地整治面积 2.50hm²，其中包括植物绿化措施面积 0.69hm²，建构筑物及硬化地面等占地面积 1.81hm²，计算项目区扰动土地整治率为 100%。各防治区扰动土地整治率计算见表 5-1。

表 5-1 扰动土地整治率计算表

项目区	扰动面积 (hm ²)	水土流失治理达标面积 (hm ²)				达到指标 (%)
		工程措施	植物措施	建(构)筑物及 路面、水域	小计	
一期工程区	2.50	0	0.69	1.81	2.50	100
合计	2.50	0	0.69	1.81	2.50	100

(2) 水土流失总治理度

工程实际水土流失面积为 0.69hm²，水土流失防治面积 0.69hm²，计算项目区水土流失总治理度为 100%。各防治区水土流失总治理度计算见表 5-2。

表 5-2 水土流失总治理度计算表

防治分区	水土流失面积 (hm ²)	水土流失防治面积 (hm ²)			水土流失总治 理度 (%)
		工程措施	植物措施	小计	
一期工程区	2.50	0	0.69	0.69	100
合计	2.50		0.69	0.69	100

(3) 拦渣率

本项目产生弃方 0.0 万 m³，余方进行综合利用。拦渣率可达 98.0% 以上。

(4) 土壤流失控制比

项目区所处区域容许土壤流失量为 500t/(km².a)，工程各项水土保持防治措施实施后，各分部防治措施开始发挥其水土保持效益，项目区内扰动类型多转化为无危害扰动。工程项目区内扰动地表经治理后，平均土壤侵蚀强度降低至 500t/(km².a) 或以下，土壤流失控制比为 1.0。

(5) 林草植被恢复率

工程可绿化面积为 0.69hm²，林草植被面积 0.69hm²，计算项目区林草植被恢复率为 100%。各林草植被面积及林草植被恢复率计算见表 5-3。

表 5-3 林草植被恢复率计算表

项目区	可绿化面积 (hm ²)	林草植被面积 (hm ²)	达到指标 (%)
一期工程区	0.69	0.69	100
合计	0.69	0.69	100

(6) 林草覆盖率

工程水土流失防治责任面积为 2.50hm²，林草植被面积 0.69hm²，计算项目区林草覆盖率为 27.6%。各防治区林草覆盖率计算见表 5-4。

表 5-4 林草植被恢复率计算表

项目区	面积 (hm ²)	林草植被面积 (hm ²)	达到指标 (%)
一期工程区	2.50	0.69	27.6
合计	2.50	0.69	27.6

(7) 指标汇总

根据以上对水土保持六项指标的计算，六项指标均达标。水土保持六项指标对比详见表 5-5。

表 5-5 水土保持六项指标计算对比表

序号	指标	水保方案目标值(%)	实际目标值(%)	达标情况
1	扰动土地整治率	98	100	达标
2	水土流失总治理度	98	100	达标
3	拦渣率	95	98	达标
4	土壤流失控制比	1.0	1.0	达标
5	林草植被恢复率	98	100	达标
6	林草覆盖率	27	27.6	达标

5.3 公众满意度调查

根据工作的规定和要求，评估调查过程中，评估组向项目区周围群众进行了调查，调查结果显示：被调查者 20 人中，除部分人对土地恢复情况不了解外，有 90% 的人认为建设单位对林草植被建设做得很好，有 90% 的人认为本工程的建设对当地群体带来了居住实惠。有 80% 的人认为本工程建设过程中采取了有效拦挡，有 80% 的人认为本工程建成后对所扰动的土地恢复好。

被访问者对当地经济影响和植被建设评价较高，绝大多数被访者认为：该工程在施工建设过程中，采取了有效的工程拦挡措施，项目完工后又及时采取植物措施，使扰动地段的植被恢复良好，基本上没有对当地的经济建设造成不好的影响。总体看，被访问者对植被建设工程评价较高。当地群众积极配合调查组的调查，并对本项目植被建设提出良好的建议，这些建议为施工后期管理、对周围环境的绿化美化以及共建和谐社会方面的都有重要的意义。

6 水土保持管理

6.1 组织领导

为保证水土保持方案的顺利实施，建设单位在项目施工阶段即成立环保水保管理组织，专人负责环保水保工作。在建设中认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，坚持做到“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）“两不”（不留后患、不留尾巴），积极落实各项水土保持措施，切实做好水土流失防治工作，确保水保工程安全，充分发挥水保工程效益。

切实加强领导，做到责任、措施和投入“三到位”进行水土保持管理。建设单位、总监办及施工单位项目部，均设置相关职能部门和专门人员负责水保工作。认真组织水土保持方案的实施，定期检查，自觉接受有关部门和社会监督。建立水土保持目标责任制，把水土保持、环保文明施工列为考评奖罚管理办法的内容之一。管理处已在施工合同处罚条款中明确处罚标准。在水土保持方案的实施中，严格监督检查，确保水土保持工程建设的进度，对各合同段水土保持方案执行情况进行全面跟踪检查，及时提出整改措施，在整体工程有效推进的同时，确保水土保持设施与主体工程同步建成。加强水土保持的宣传、教育工作。要求各施工、监理单位普及水土保持知识，做好水土保持宣传教育工作，提高全员的水土保持意识。加大信息跟踪，切实做好沿线的水土保持工作。

6.2 规章制度

在项目建设过程中，建设单位建立了完善的管理体系，实施运转灵活的管理机制，建立健全各项规章制度，严格推行制度管理。实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理等规章制度，从制

度上保证和规范各项工程顺利建成、并投入使用奠定了基础。

(1) 项目法人责任制

为了贯彻落实建设项目法人责任制，明确项目的建设责任主体、责任范围、目标和权益，提高投资效益，中国移动通信集团广东有限公司广州分公司为项目法人，对项目建设进行全面管理、负责、调度和指挥。建设管理组织机构健全，职责及分工明确，规章制度齐全，这些都为项目建设、各项工程有序实施打下了良好的基础。

(2) 招标投标制

严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，遵循国内竞争性招标采购原则和程序，择优选择施工承包人和监理单位。项目招标投标活动始终贯彻“公平、公正、科学、择优”的原则，成立了招标工作领导小组、评标专家组和招标工作办公室。招标工作办公室负责具体事务性工作，资格预审、标前会议、发售标书、清理标书等；评标专家组负责对标书评审，提出评审报告，推荐中标候选人；招标工作领导小组定标，按权限经审查批准。各项招投标活动内容全面，行为规范，审批手续完善，所有招投标活动均在监督下进行。

(3) 建设监理制

项目全面实行工程建设监理制度，监理单位在与工程部签订的合同条款规定范围内，独立行使工程监理职能。监理公司成立了专门的项目施工监理组织机构，编制工程监理实施细则。监理人员严格按照实施细则的要求，围绕质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、档案管理、监理工作制度等监理工作程序，全面实施工程建设监理。

(4) 合同管理制

项目建设过程中，勘测设计、工程监理、设备采购、材料供应、工程施工、拆迁补偿等均签订相应的合同，明确规定各自的权利和义务，建设单位、设计单位、监理单位和施工单位都严格按照合同办事。为了

强化工程建设的合同管理，更好地对合同执行情况实施监督，工程部制定详细的合同管理规章制度，并组织管理、监理人员深入学习合同文件，提高合同管理和监督能力；同时，以合同文件为依据，加强对合同执行情况的检查督促，严格要求各施工承包人切实执行合同，兑现各项承诺，严把工程合同管理关。

6.3 建设过程

工程开工前由监理单位在审批施工单位施工组织设计方案时详细审查水土保持工程项目施工措施和施工计划的合理性和可行性。各项目部以工程管理部为综合治理工作责任部门，具体落实各项措施落实情况，工程部制定相应实施方案及做好相应交底，并做好施工过程管理工作。项目驻地采用未利用裸地，避免了对植被良好区域破坏及引起水土流失等问题。临建设施严格按“双标”管理要求建设，减少植被、水土破坏，场地周边均设置完善的排水系统，场地进出口均设置洗车槽，避免作业场地泥土污染至场外及地方道路而引起地方环境破坏。排水出口均设置沉淀池，泥土和废渣集中处理。

路基边坡采用了植草防护以及临时遮盖等综合措施，减少水土流失。建设单位重视加强施工过程中的水土保持及环境保护资料管理，配备专职管理人员，定期对工程建设中的工程监理月报、水土保持、环境保护监测季报、整改资料等进行归档和梳理，及时总结和发现问题，定期将资料移交资料室保存。

6.4 水土保持监测

6.4.1 监测概况

2017年5月，建设单位委托珠江水资源保护科学研究所开展本项目的水土保持监测工作。接受委托后，监测单位组织水土保持监测技术人员按照水土保持监测有关技术规范和合同要求，开展水土保持监测工作。

监测单位接受任务后，听取了建设单位关于工程项目的详细介绍，组织监测人员多次到项目区全面调查了解工程建设的详细情况，根据《水土保持监测技术规程》以及已批复的水土保持方案，制订了监测实施方案；依据监测实施方案，进行了现场巡查、实地测量和走访座谈；对建设单位提供的技术资料进行分析对比；查阅项目监理单位的监理资料；选择重点监测区域、设立样方进行详细测量调查，经过核查和取证，获取了项目建设过程中有关工程建设的报告、图件、照片、影像等资料。监测单位根据监测成果报送要求，在监测期间按时报送监测季报，并在监测结束后完成监测总结报告。

水土保持方案批复后，建设单位在项目建设过程中落实水土保持措施基本到位，最大限度的减少了项目建设过程中新增水土流失。

6.4.3 监测结果

工程运行期间随着水土保持设施发挥效益，工程扰动范围已经基本得到治理，基本无水土流失量。监测分析显示：工程扰动土地治理率 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 98%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 27.6%，六项指标达到批复方案防治目标要求，水土保持效果达标。

总体而言，目前防治责任范围内均采取了水土保持措施，水土保持工程措施体系布局合理，有效地控制了因工程建设引起的水土流失，基达到水土保持方案设计要求。

6.5 水土保持监理

主体工程监理单位广州市广州工程建设监理有限公司负责水土保持工程监理任务。监理单位接受任务后，成立了中国移动（广东广州）数据中心一期工程工程监理部，组织人员编制了《监理规划》、《监理细则》等，供现场监理人员和施工承包商在施工过程中共同遵守。

在中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持工程监理工作中，严格执行合同条款和《中华人民共和国水土保持法》等法律法规等规章制度，以及批复水土保持方案报告书等技术依据。监理人员进入施工现场，参与项目前期工作，收集相关资料，全面展开水土保持监理工作，对水土保持设施建设质量、进度、投资进行控制。该项目采取旁站监理和巡回监理的方法，总监理工程师按照合同要求，适时安排监理工程师进入实地进行收集资料、上图、测量、计量、编写监理报告等有关事宜。监理工程师对工程参与者的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

2017年2月28日，广州市黄埔区水务局前往项目现场监督检查，主要了解了项目水土保持方案、监测落实情况、项目施工进度情况、水土保持措施落实情况及现场存在的问题等。项目建设单位按照黄埔区水务局的意见，督促施工单位完善水土保持措施体系，及时对预留空地区布置撒播草籽+密目网覆盖等水土保持措施。项目在施工过程中，水土保持措施落实到位，未发生较大的水土流失。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据广州市黄埔区水务局埔水函[2016]268号文《关于中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案的复函》以及《中国移动（广东广州）数据中心一期工程水土保持方案报告书》（报批稿），根据水土保持方案批复，本项目水土保持补偿费待广州市相关办法出台后进行补缴。

6.8 水土保持设施管理维护

建设期水土保持工程措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已

完成，运行期各项水土保持措施根据工程区域运行具体完成情况及时实施批复方案中设计的水土保持措施或及时采取相应的防护措施，确保达到水土保持的要求。

对于工程永久用地范围内的水土保持工程措施，由中国移动通信集团广东有限公司广州分公司进行管理维护，落实管护制度，明确责任单位和责任人，做好工程措施的维修工作。

从目前运行情况看，有关水土保持的管理责任较为落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有一定保证。

目前项目水土保持设施运行状况良好，水土保持设施能够持续发挥效益。

7 结论及下阶段工作安排

7.1 结论

中国移动通信集团广东有限公司广州分公司高度重视工程建设中的水土保持工作，按照有关水土保持法律、法规的规定，编报了水土保持方案报告书，并上报广州市黄埔区水务局审查、批复。之后将水土保持内容纳入初步设计中，并将其纳入到主体工程的招标投标、施工组织设计中，明确了建设过程中项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责。同时加强设计和施工监理，强化设计、施工变更管理，使水土保持工程设计随主体工程的设计优化而不断优化，确保了水土保持方案的实施，有效地防治了工程建设期间的水土流失。工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，确保了水土保持设施的施工质量。水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

通过一系列水土保持设施的防控，项目区原有水土流失基本得到治理，新增水土流失得到有效控制，水土保持设施能有效运行。工程实施水土保持项目的工程量和施工质量满足工程安全运行需要和水土保持要求，经初步运行，效果良好，总体质量合格。建设单位在落实水土保持方案过程中，明确建设过程中项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的水土保持职责，确保水土保持方案的顺利实施，水土流失防治效果达到国家有关法律法规和技术规范的要求，总体实施结果和管护措施达标。中国移动（广东广州）数据中心一期工程确定的防治任务，资金得到落实，完成的水土保持设施质量总体合格。

综上所述，建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；

水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

7.2 遗留问题安排

本项目水土保持设施验收无遗留问题。对一期工程区运行期间应加强水土保持设施的管理和维护，包括排水和绿化工程，保证水土保持功能的正常效益发挥。

8 附件及附图

8.1 附件

- 附件 1： 项目建设及水土保持大事记；
- 附件 2： 一期工程备案证；
- 附件 3： 二期工程备案证；
- 附件 4： 建设工程规划许可证；
- 附件 5： 项目可行性研究报告、初步设计批复文件；
- 附件 6： 项目水土保持方案批复文件；
- 附件 7： 园林绿化质量记录表；
- 附件 8： 室外排水管网质量记录表；
- 附件 9： 现场照片；
- 附件 10： 遥感对比图。

8.2 附图

附图 1：总平面布置图

附图 2：主体工程室外排水总平面图。

附图 3：防治责任范围及绿化水土保持措施竣工图。
